

第5回 伊豆山復興まちづくり推進懇話会

【熱海市伊豆山復興計画における 施策の進捗状況について】

令和7年9月30日

熱海市伊豆山復興事業計画 施策実施状況

熱海市伊豆山復興事業計画 施策実施状況 (令和7年3月末時点)																																																																																																																									
基本目標	基本方針	主要施策	取組目標	進捗区分 (完了・継続)	実施状況 (実施・未実施)									実績値【R6】/累積値【R4~R6】	R6年度取組内容	今後の取組		担当課																																																																																																							
					短期			中期			長期					R6年度	R7年度		R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度	R21年度	R22年度	R23年度	R24年度	R25年度	R26年度	R27年度	R28年度	R29年度	R30年度	R31年度	R32年度	R33年度	R34年度	R35年度	R36年度	R37年度	R38年度	R39年度	R40年度	R41年度	R42年度	R43年度	R44年度	R45年度	R46年度	R47年度	R48年度	R49年度	R50年度	R51年度	R52年度	R53年度	R54年度	R55年度	R56年度	R57年度	R58年度	R59年度	R60年度	R61年度	R62年度	R63年度	R64年度	R65年度	R66年度	R67年度	R68年度	R69年度	R70年度	R71年度	R72年度	R73年度	R74年度	R75年度	R76年度	R77年度	R78年度	R79年度	R80年度	R81年度	R82年度	R83年度	R84年度	R85年度	R86年度	R87年度	R88年度	R89年度	R90年度	R91年度	R92年度	R93年度	R94年度	R95年度	R96年度	R97年度	R98年度	R99年度	R100年度
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12																																																																																																												
1 安全・安心の確保	1 安全なまちづくり	1 蓬初川流域を一体とした流域管理への取組	宅地造成及び特定土壌等規制法施行にかかる対応と宅地関係にかかる法令の整理	継続	宅地造成法令整理及び的確な指導体制(県市)										0%	50%	70%	100%	25%/50%	情報収集・法令整理及び指導体制(衛星監視含む)	県との事務分担整理	新法令による指導	まちづくり課																																																																																																		
			新築土法にかかる情報収集	完了	砂防堰堤新築										1施設	-	-	-	1施設	-	-	熱海市都市整備課(静岡県)(国土交通省)																																																																																																			
			2 地域の状況に応じた安全確保対策の推進	蓬初川の河川改修	継続	河川改修										0m	-	596m	-	61m/61m	設計・用地買収・工事	設計・用地買収・工事	-	熱海市都市整備課(静岡県)																																																																																																	
			3 命を守る生活道路の整備	市道岸谷本線外道路・取付道路の整備	用地買収・設計	継続	用地買収・設計										0m	161m	366m	-	30m/30m	設計・用地買収・工事	用地買収・工事	維持管理	都市整備課																																																																																																
					工事	継続	維持管理										0%	50%	70%	100%	0%/62.7%	維持管理・用地買収	維持管理	維持管理	都市整備課																																																																																																
					必要箇所の整備・維持修繕による機能強化	継続	必要箇所の整備・維持修繕による機能強化										0%	50%	70%	100%	0%/62.7%	維持管理・用地買収	維持管理	維持管理	都市整備課																																																																																																
			4 避難所・避難路の整備	伊豆山小学校の指定避難所機能の向上、地域の公民館等の一時避難場所の活用検討	災害ボランティアセンター活動拠点、資機材の整備	継続	避難所・避難路の計画的整備の実施										備蓄資機材の整備実施	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	危機管理課																																																																																														
					災害時の迂回路の整備	継続	調査										0%	30%	60%	100%	0%/0%	整備内容の検討	整備内容の検討・施工	整備内容の検討・施工	危機管理課																																																																																																
					狭あい道路の整備・改良の推進と交通安全対策の実施	津波避難経路整備(伊豆山温泉線)	継続	調査										25%	50%	70%	100%	短期目標達成済(R5年度)	-	設計	工事・維持管理	都市整備課																																																																																															
					土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした広報誌の充実	継続	窓口での指導										0回	年1回特集の維持	隔年1回特集の維持	隔年1回特集の維持	年1回特集の維持	窓口に加え広報誌活用	窓口に加え広報誌活用	窓口に加え広報誌活用	まちづくり課																																																																																																
	土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした申請者に対する窓口指導	継続			広報誌での周知(HP、SNS活用)										4件	10件	権限移譲の状況により判断	権限移譲の状況により判断	10件/18件	窓口における周知	窓口における周知	窓口における周知	まちづくり課																																																																																																		
	2 安心なまちづくり	2 地域防災機能の充実	消防団第4分団詰所の整備	「わたしの避難計画」の作成・普及事業の推進	継続	「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上への取り組み										100%	100%	-	-	100%	作成説明、避難計画の更新(見直し)周知	作成説明、避難計画の更新(見直し)周知	作成説明、避難計画の更新(見直し)周知	危機管理課																																																																																																	
				整備事業の推進	継続	整備、維持管理による機能強化										20%	40%	100%	-	20%/40%	用地買収・設計	工事	維持管理	消防総務課																																																																																																	
				消防団第4分団消防ポンプ自動車更新配備	継続	整備、維持管理による機能強化										100%	-	-	-	100%	維持管理	維持管理	維持管理	消防総務課																																																																																																	
				消火栓の整備	継続	整備事業の推進										0%	40%	70%	100%	20%/40%	消防水利の状況把握・設置	消防水利の状況把握・設置	維持管理	消防総務課																																																																																																	
自主防災会活動の支援・充実				継続	整備事業の推進・維持管理の機能強化										60%	70%	80%	100%	10%/70%	自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施	自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施	自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施	危機管理課																																																																																																		
3 危機管理体制の強化	熱海市地域防災計画の見直し	熱海市地域防災計画の見直し	継続	改定済										改定済	改定済	毎年度見直し	毎年度見直し	改定済	地域防災計画の見直し	地域防災計画の見直し	地域防災計画の見直し	危機管理課																																																																																																			
		SNS等を活用した災害情報の提供に関する判断基準及び伝達体制の整備	継続	「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化										100%	100%	-	-	100%	情報発信手段の多様化	情報発信手段の多様化	情報発信手段の多様化	危機管理課																																																																																																			

取組目標 【逢初川の河川改修】



伊豆山神社線・上流 完成 (R7.6.4 撮影)



伊豆山神社線・下流 完成 (R7.6.24 撮影)



暗渠区間 施工状況 上流から (R7.9.2 撮影)



暗渠区間 施工状況 下流から (R7.9.2 撮影)


取組目標 【市道岸谷本線外道路・取付道路の整備】



スロープ

岸谷2号線 現況 (R7.9.2現在)

「伊豆山神社線からの取付道路について」

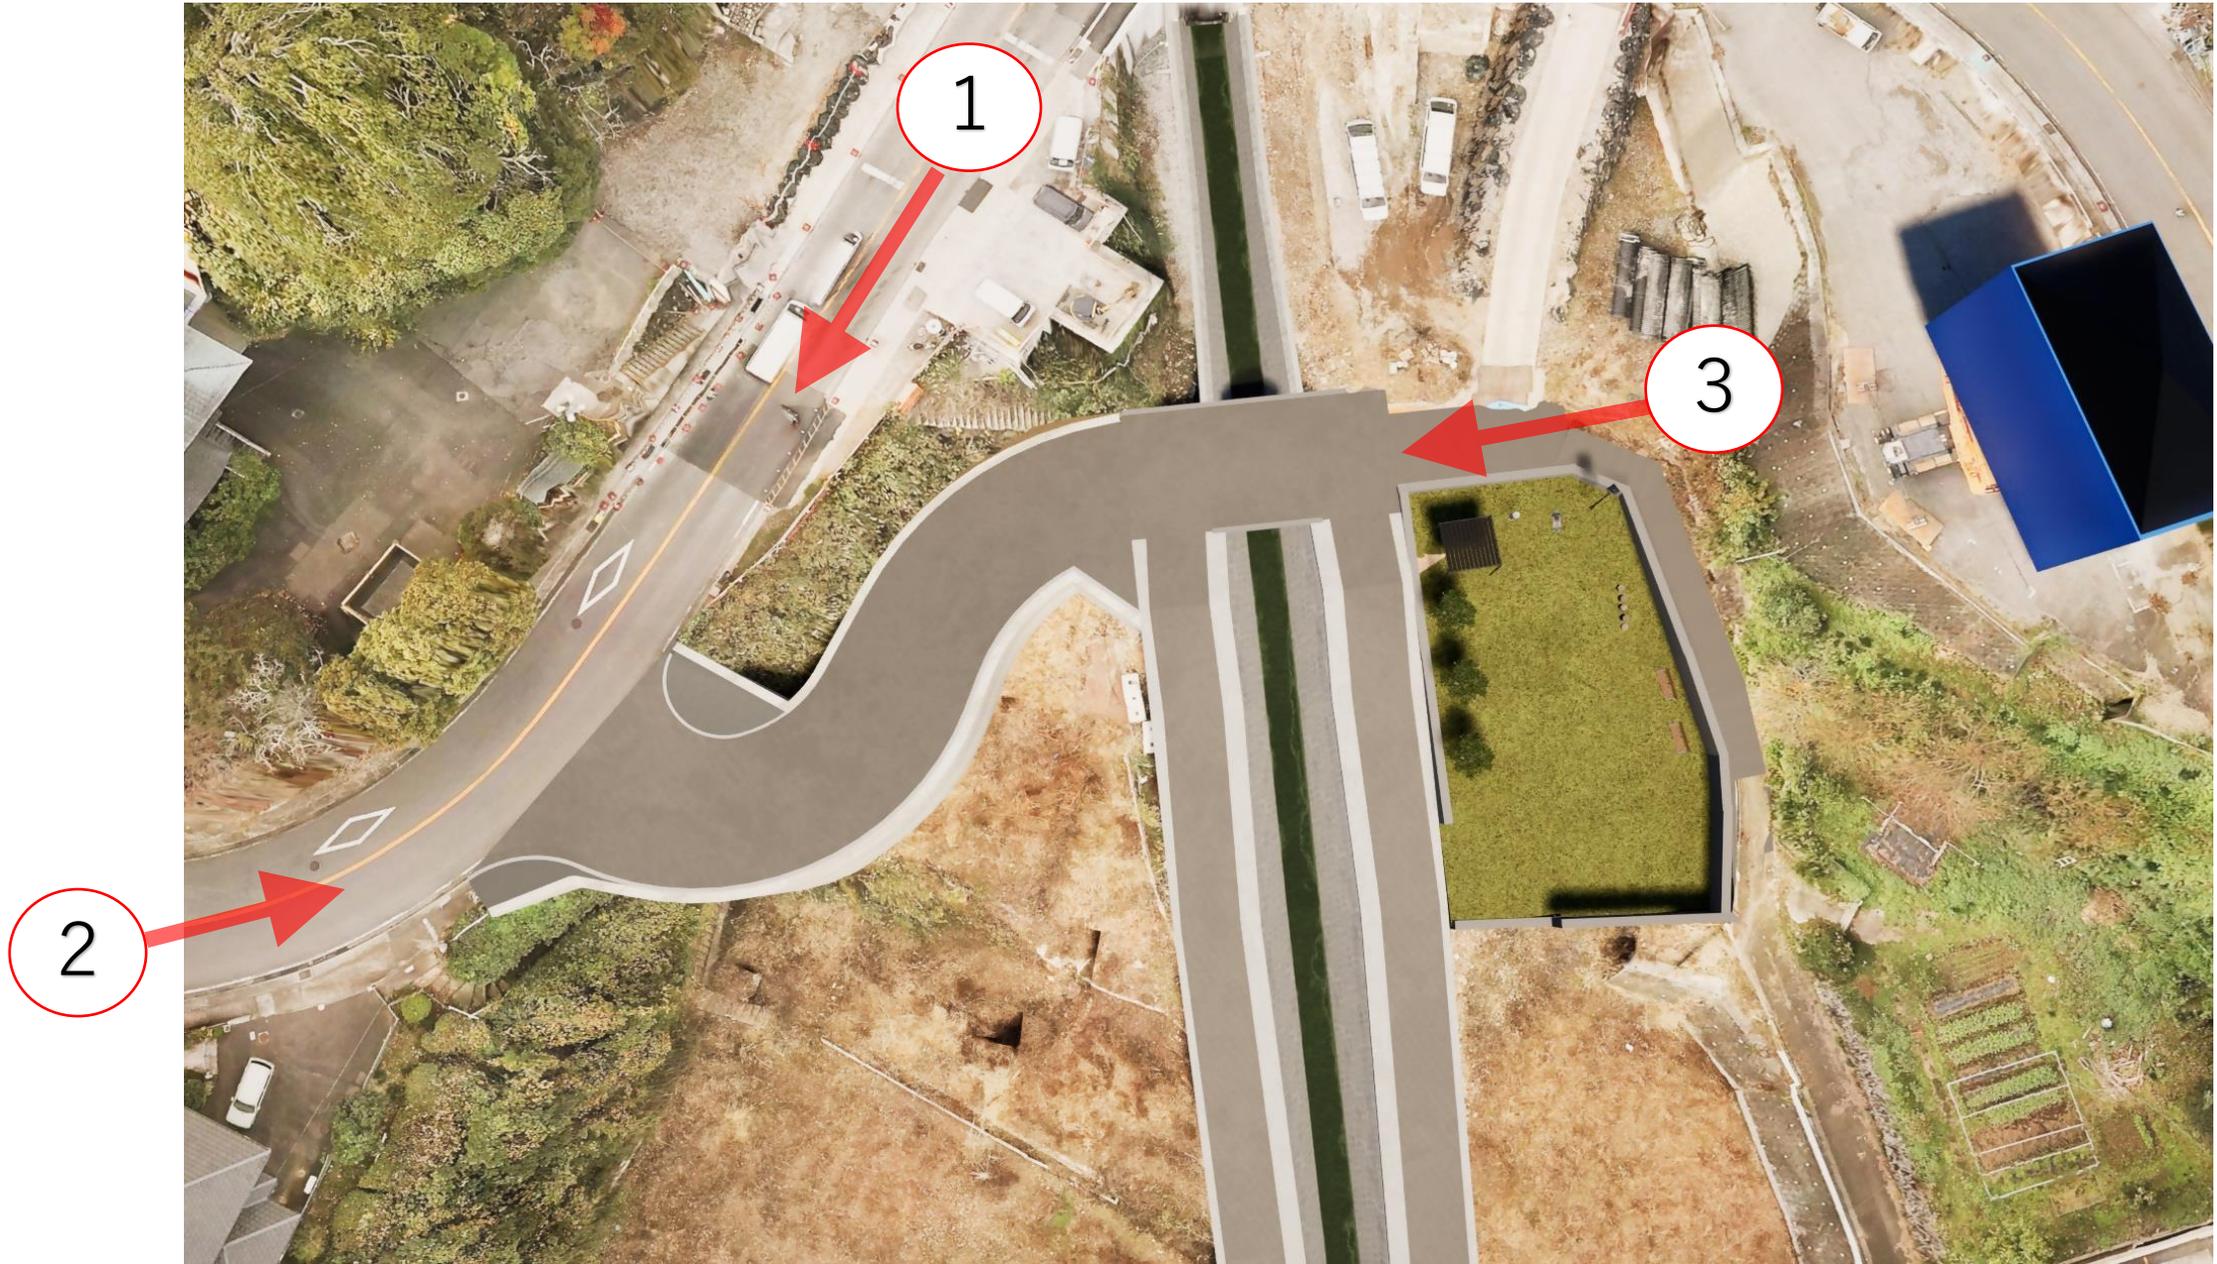

取付道路（イメージ）

1

伊豆山神社方面から



2

熱海駅方面から



3

市道岸谷1号線から



取組目標 「消防団第4分団詰所の整備」

— 第四分団 建設候補地 —



完成イメージ図



取組目標「生活再建に向けた相談体制の充実」

「いずさんっち」外観



伊豆山復興相談窓口



【相談窓口入口(いずさんっち裏)】



【相談窓口風景(令和7年4月24日開設時)】

<参加人数>

R7 / 4月	5月	6月	7月	8月
0人	4人	2人	1人	1人

<主な意見>

- ・市道岸谷3号線の拡幅工事進捗について
- ・公園について子供や若年層の意見も参考にして整備してほしいなど。

取組目標「伊豆山地域の歴史文化に関わる講演会等」

【概要・目的】

- ・伊豆山地域の歴史文化の継承に寄与できる講座等を開催。
- ・地域が伝えてきた「歴史・文化資産」を大事に守り、活用していくための人材育成を目的とする。

令和6年度
約150名参加
(計7回開催)

【講座内容（令和6年度）】 ※一部抜粋

- 宝冠阿弥陀（ほうかんあみだ）は光り輝く？－伊豆山の常行堂（じょうぎょうどう）を廻る話－
- 交通の要衝としての中世伊豆山 等

参加者の声 ※一部抜粋

まだ伊豆山神社に行ったことはないが是非訪れてみたい。伊豆山神社がいかに大切な場所であったか知ることができた。（熱海70代以上女性）

偶然だが、5月に比叡山に行ってきたので興味深かった。（熱海30代女性）

取組目標「公有地（猪洞市営住宅跡地）の有効活用に向けた整備」

（仮称）伊豆山地区コミュニティ防災センター建設計画地 @猪洞市営住宅跡地

完成イメージ図

